报告编号：JKH260703001G

检 验 报 告

项 目 名 称： 漳州市谛壹燕生物科技有限公司空气洁净度、环境参数检测项目

委 托 单 位： 漳州市谛壹燕生物科技有限公司

检 验 类 型： 委托检验

吉 克 检 测 技 术（福 建）有 限 公 司

JiKe Testing Technology (Fujian) Co., Ltd.

地址：福建省漳州市龙文区公港北路 号　　邮编：363000

电话：0596-2100021　　邮箱：sales@jiketest.com

检 验 报 告

报告编号：JKH260703001G

委托单位	名称	漳州市谛壹燕生物科技有限公司		
	地址	福建省漳州市龙文区浦口路 3 号车间		
项目信息	受检单位名称	漳州市谛壹燕生物科技有限公司	检验当日室外温度(° C)	27
	受检单位地址	福建省漳州市龙文区浦口路 3 号车间	检验当日室外相对湿度(%)	83
	受检区域	（见续页）		
	状态	静态		
	受检区域净化级别洁净度（洁净度）	净化级别	数量（间）	
		Ⅰ级（100 级）	/	
		Ⅱ级（10000 级）	6	
		Ⅲ级（100000 级）	2	
		Ⅳ级（1000000 级）	/	
检验项目		（见续页）		
检验类型		委托检验		
检验依据		GB 50687-2011《食品工业洁净用房建筑技术规范》		
检验方法		（见续页）		
检验日期		2026-07-03～2026-07-15		
检验结果		（见续页）		
检 验 结 论		本报告仅提供单项检验结论，详见本报告续页。 （检测报告专用章） 签发日期：2026-07-15		
备 注		本报告为 JKH260703001 的替换报告，原报告作废。		

注意事项

1. 报告无骑缝章及本公司“检验报告专用章”或检验单位公章无效。2. 未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
6. 委托检验仅对来样负责，客户提供的样品和信息的准确性、适当性、完整性，本公司不承担证实责任。
7. 未经本公司书面同意，委托人不得擅自使用检验报告进行不当宣传。

批准：　　审核：　　编制：

检 验 报 告

表一：检测项目、方法及仪器

序号	检验项目	检测方法	检测仪器及型号	
1	换气次数	GB 50591-2010	风量仪	testo410-1
2	静压差	GB 50591-2010	智能风速风压风量仪	/
3	悬浮粒子	GB/T 16292-2025	尘埃粒子计数器	CLJ-E301
4	温度	GB 50591-2010	数字温湿度计	TES 1360A
5	相对湿度			
6	照度	GB 50591-2010	光照度计	ZDS-10
7	噪声	GB 50591-2010	多功能声级计	AWA5636
8	沉降菌	GB/T 16294-2025	Φ90mm 培养皿	/
9	浮游菌	GB/T 16293-2025	浮游细菌采样器	JYQ-III
10			Φ90mm 培养皿	/

检 验 报 告

表二：空气洁净度检验结果及结论

编号	洁净室名称	设计级别	悬浮粒子（粒/m³）				空气沉降菌 (CFU/30min)		空气浮游菌 (CFU/m³)		检验检测结论
			≥0.5μm		≥5μm						
			限值	检测结果	限值	检测结果	限值	检测结果	限值	检测结果	
1	二更间	Ⅲ级	≤3520000	330418	≤29300	6047	≤4	2	≤150	20	符合
2	洗消间	Ⅲ级	≤3520000	322335	≤29300	6110	≤4	3	≤150	30	符合
3	定型间	Ⅱ级	≤352000	331581	≤2930	1933	≤1.5	1	≤50	4	符合
4	过道（内部）	Ⅱ级	≤352000	242567	≤2930	2188	≤1.5	1	≤50	8	符合
5	风干间（1）	Ⅱ级	≤352000	217907	≤2930	1998	≤1.5	1	≤50	4	符合
6	风干间（2）	Ⅱ级	≤352000	216725	≤2930	2026	≤1.5	1	≤50	12	符合
7	包装间（1）	Ⅱ级	≤352000	218172	≤2930	1938	≤1.5	1	≤50	4	符合
8	包装间（2）	Ⅱ级	≤352000	209798	≤2930	2125	≤1.5	1	≤50	4	符合


检 验 报 告

表三:环境参数检验检测结果

编号	洁净室名称	静压差		换气次数（次/h）	照度（lx）	噪声 Db（A）	相对湿度（%）	温度（℃）
		（+）端/（-）端（洁净室编号）	Pa					
1	二更间	2/1	6	40	617	44.6	56.3	24.6
		1/9	8	46	609	46.2	56.7	24.5
2	洗消间	3/2	7	42	604	46.1	56.4	24.2
3	定型间	4/3	6	45	609	48.2	56.3	24.2
4	过道（内部）	5/4	7	64	609	43.5	56.7	24.5
		6/4	6	58	601	44.3	56.2	24.1
		8/4	7	62	617	46.2	56.3	24.6
5	风干间（1）	6/5	6	48	609	46.6	55.8	24.3
6	风干间（2）	7/6	7	35	607	48.2	56.2	23.9
7	包装间（1）	8/4	7	45	609	46.9	56.6	24.5
8		8/10（外包间）	12	72	602	45.7	56.4	24.4
9	包装间（2）	7/6	7	35	610	44.6	55.1	24.3
10		7/10（外包间）	12	73	605	45.2	56.1	24.4
标准限值		与相邻不同级别洁净房间≥5Pa，与室外≥10Pa		Ⅱ级≥20 Ⅲ级≥15	加工场所工作面一般≥200 照明加工场所工作面混合照明≥500 非加工场所工作面一般照明≥100	≤60	Ⅱ级要求30~65 Ⅲ级要求30~70	Ⅱ级舒适性要求20~25 Ⅲ级舒适性要求18~26
检验检测结论		符合		符合	符合	符合	符合	符合

检 验 报 告

图 1：洁净室（区）监测点位示意图

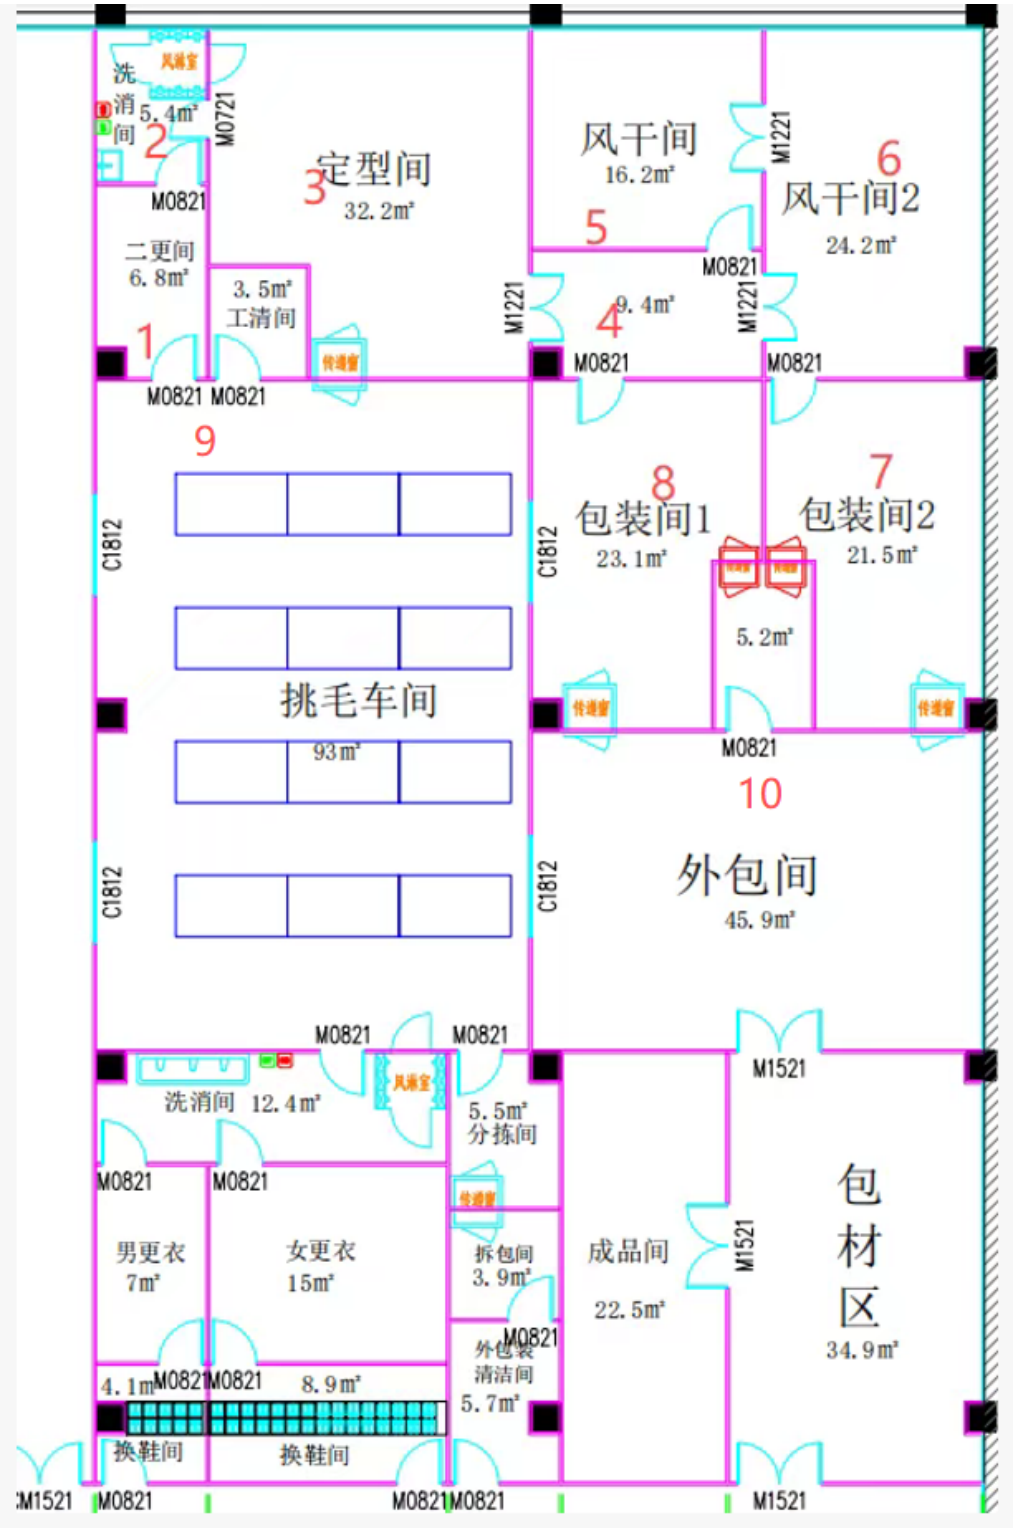

（以下无内容）
